

御杖プロジェクト — アーンドバリュー管理計画

パフォーマンス基準値・コスト管理・予測フレームワーク

フェーズ0〜3・2026年4月〜2028年9月

1. 目的と対象範囲

本EVM計画は、御杖持続可能エネルギー・AIデータセンタープロジェクトのフェーズ0〜3（30か月間）にわたるパフォーマンス測定基準（PMB）を確立するものです。スケジュールとコストのパフォーマンス測定方法、ステークホルダーへの進捗報告、完成時コストおよび日程の予測方法を定めています。

本計画の対象期間は**2026年4月〜2028年9月（30か月間）**です。フェーズ4（運営・拡大期、31か月目以降）は資金調達方法が異なり（事業収益による）、フェーズ1の結果確認後に翌年計画するため、基準値には含みません。

現行基準値のデータ日付：2026年5月18日（第2か月末）

2. EVM基本指標

用語	記号	計算式	意味
計画価値	PV	時間配分済み予算	予定通り完了すべき作業の予算コスト
アーンドバリュー	EV	達成率 × BAC	実際に完了した作業の予算コスト
実際コスト	AC	請求書 + 人件費	実際に支出した金額
完成時予算	BAC	PV合計	PMBの総承認予算
スケジュール差異	SV	EV - PV	マイナス = 計画より遅れ
コスト差異	CV	EV - AC	マイナス = 予算超過
スケジュール効率指数	SPI	EV ÷ PV	1.0未満 = 遅延
コスト効率指数	CPI	EV ÷ AC	1.0未満 = 予算超過
完成時見積	EAC	AC + (BAC - EV) ÷ CPI	最終コスト予測
残作業見積	ETC	EAC - AC	残作業コスト予測
完成時差異	VAC	BAC - EAC	完了時の超過・節約予測
完了時効率指数	TCPI	(BAC - EV) ÷ (BAC - AC)	予算内完了に必要な効率

3. 予算構造

3.1 予算サマリー

区分	項目	予算（百万円）	BAC比率
総プロジェクト予算		¥185.0M	—
— マネジメント予備費（10%）	PMB対象外	¥17.0M	—
パフォーマンス測定基準（BAC）		¥168.0M	100%
1.0	プロジェクト管理・ガバナンス	¥8.0M	4.8%
2.0	フェーズ0 — 準備期	¥0.25M	0.1%
3.0	フェーズ1 — 基盤構築期	¥5.5M	3.3%

区分	項目	予算 (百万円)	BAC比率
4.0	フェーズ2 ― 試験設計期	¥22.25M	13.2%
5.0	フェーズ3 ― 試験建設期	¥132.0M	78.6%

マネジメント予備費 (¥17M) は代表理事が管理し、**PMBには含まれません**。予見不可能なスコープへの対応のみを目的とし、理事会の承認を得た場合にのみ取り崩し可能です。

3.2 作業分解構造 (WBS) ― 予算詳細

WBS	項目	予算 (¥M)	フェーズ
1.0	プロジェクト管理・ガバナンス		
1.1	PMチーム中核 (代表理事 + コーディネーター)	¥4.0M	全期間
1.2	法務・会計・行政書士費用	¥2.5M	全期間
1.3	広報・ウェブサイト・翻訳	¥1.5M	全期間
	小計 1.0	¥8.0M	
2.0	フェーズ0 ― 準備期		
2.1	地域ステークホルダーとの対話・交通費	¥0.10M	P0
2.2	憲章・書類作成	¥0.10M	P0
2.3	創設チームの特定	¥0.05M	P0
	小計 2.0	¥0.25M	
3.0	フェーズ1 ― 基盤構築期		
3.1	一般社団法人設立	¥0.5M	P1
3.2	林業フィージビリティスタディ	¥1.5M	P1
3.3	エネルギーシステム調査	¥1.5M	P1
3.4	建物・敷地調査	¥0.8M	P1
3.5	通信環境調査	¥0.4M	P1
3.6	アドバイザリーボード・銀行口座・会計設立	¥0.8M	P1
	小計 3.0	¥5.5M	
4.0	フェーズ2 ― 試験設計期		
4.1	構造・建築設計	¥2.0M	P2
4.2	エネルギーシステム設計	¥2.0M	P2
4.3	データセンター・IT設計	¥1.0M	P2
4.4	EV充電システム設計	¥1.0M	P2
4.5	許認可・規制対応 (METI、FIT、林業)	¥3.5M	P2
4.6	提携・土地所有者契約	¥1.5M	P2
4.7	補助金申請	¥2.0M	P2
4.8	スタッフ採用・研修 (パートタイム2〜3名)	¥6.0M	P2

WBS	項目	予算 (¥M)	フェーズ
4.9	ベンダー事前選定	¥1.5M	P2
4.10	フェーズ2予備費	¥1.75M	P2
	小計 4.0	¥22.25M	
5.0	フェーズ3 ー 試験建設期		
5.1	校舎改修 (棟1区画)	¥25.0M	P3
5.2	太陽光発電設置 (約100kW)	¥15.0M	P3
5.3	蓄電池システム	¥12.0M	P3
5.4	EV充電インフラ (4基)	¥8.0M	P3
5.5	データセンター設備 (サーバー10〜20台)	¥20.0M	P3
5.6	林業作業 (5〜10ha伐採・植替)	¥18.0M	P3
5.7	光ファイバー接続強化	¥10.0M	P3
5.8	試験・調整・稼働開始	¥8.0M	P3
5.9	フェーズ3予備費 (13%)	¥16.0M	P3
	小計 5.0	¥132.0M	
	合計 BAC	¥168.0M	

4. 時間配分基準値 (S字曲線)

30か月にわたる月別計画支出と累積計画価値。フェーズ内の支出は調査・設計に前倒しされ、建設支出は22〜27か月目にピークを迎えます。

月	年月	フェーズ	月別PV (¥M)	累積PV (¥M)	進捗率
M1	2026年4月	P0	0.05	0.05	0.0%
M2	2026年5月	P0	0.10	0.15	0.1%
M2 ← 基準日					
M3	2026年6月	P0	0.10	0.25	0.1%
M4	2026年7月	P1	0.20	0.45	0.3%
M5	2026年8月	P1	0.50	0.95	0.6%
M6	2026年9月	P1	0.80	1.75	1.0%
M7	2026年10月	P1	1.20	2.95	1.8%
M8	2026年11月	P1	1.50	4.45	2.6%
M9	2026年12月	P1	1.30	5.75	3.4%
M10	2027年1月	P2	1.50	7.25	4.3%
M11	2027年2月	P2	2.20	9.45	5.6%
M12	2027年3月	P2	2.80	12.25	7.3%
M13	2027年4月	P2	3.00	15.25	9.1%

月	年月	フェーズ	月別PV (¥M)	累積PV (¥M)	進捗率
M14	2027年5月	P2	3.00	18.25	10.9%
M15	2027年6月	P2	3.00	21.25	12.7%
M16	2027年7月	P2	2.50	23.75	14.1%
M17	2027年8月	P2	2.50	26.25	15.6%
M18	2027年9月	P2	2.00	28.25	16.8%
M19	2027年10月	P3	3.00	31.25	18.6%
M20	2027年11月	P3	5.00	36.25	21.6%
M21	2027年12月	P3	8.00	44.25	26.3%
M22	2028年1月	P3	12.00	56.25	33.5%
M23	2028年2月	P3	15.00	71.25	42.4%
M24	2028年3月	P3	15.00	86.25	51.3%
M25	2028年4月	P3	18.00	104.25	62.1%
M26	2028年5月	P3	18.00	122.25	72.8%
M27	2028年6月	P3	15.00	137.25	81.7%
M28	2028年7月	P3	15.00	152.25	90.6%
M29	2028年8月	P3	10.00	162.25	96.6%
M30	2028年9月	P3	5.75	168.00	100.0%
	BAC		¥168.0M		

S字曲線の形状

支出プロファイルは典型的な**緩やか→加速→緩やか**のS字曲線を描きます：

- **M1～M9**（フェーズ0～1）：立ち上げ期 — 法人設立、フィージビリティスタディ
- **M10～M18**（フェーズ2）：加速期 — 詳細設計、許認可申請、補助金申請
- **M19～M28**（フェーズ3中核）：ピーク支出期 — 建設・調達・設置工事
- **M29～M30**（フェーズ3完了）：逡減期 — 試験調整、完了検査、引渡し

図1 — 基準値S字曲線（累積計画価値）


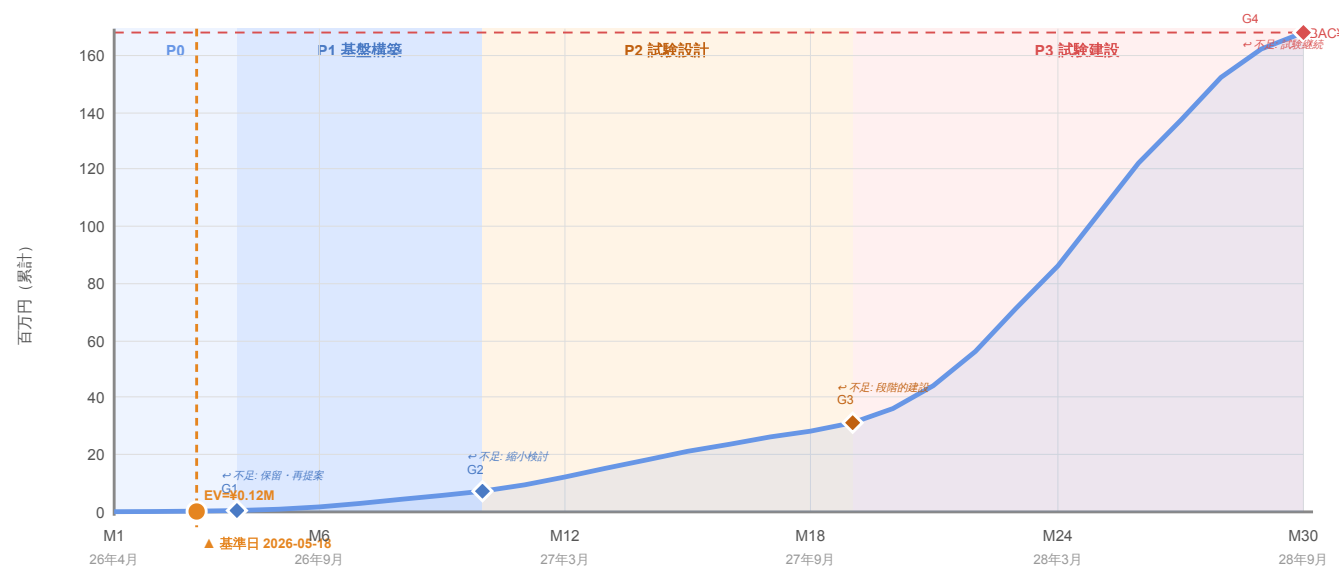


図2 — 月別計画支出（フェーズ別）

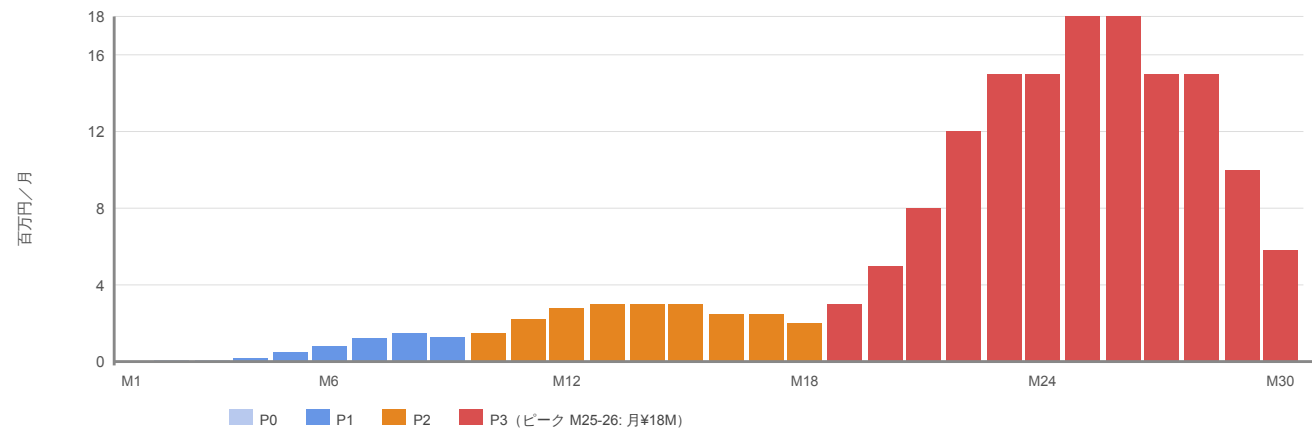

5. 現状パフォーマンス

データ日付：2026年5月18日（第2か月末）

5.1 状況説明

プロジェクトはフェーズ0 — 準備期にあります。現在進行中の活動は、村のリーダーシップとの非公式な対話、憲章の予備草案作成、創設チーム候補者の特定です。日本人共同設立者候補の探索は継続中ですが未確定 — これがフェーズ0の最も重要な依存事項です。

支出は個人的な交通費、書類翻訳費、奈良市内の行政書士への初期相談費用のみです。主要な契約はまだ締結されていません。

5.2 パフォーマンス指標 — フェーズ0

指標	値	備考
PV（基準日時点の計画価値）	¥0.15M	M2末時点の計画支出
EV（基準日時点のアーンドバリュー）	¥0.12M	フェーズ0作業の約80%完了
AC（基準日時点の実際コスト）	¥0.08M	計画を下回る — 主に個人時間
SV（スケジュール差異）	-¥0.03M	共同設立者未確定のため若干遅延
CV（コスト差異）	+¥0.04M	P0コスト計画より低いため予算内

指標	値	備考
SPI	0.80	計画作業の80%を予定通り達成
CPI	1.50	支出¥1につき¥1.50の価値を創出

図3 — EVM現状ダッシュボード（基準日：2026年5月18日）



注意：第2か月時点のCPI 1.50は一部フェーズ0の特性によるものです — 価値創出の大半が予算化された支出ではなく個人時間によるものです。フェーズ1のフィージビリティスタディ契約が確定するまで、このCPIをプロジェクト全体の予測に外挿しないでください。

5.3 フェーズ0 予測

指標	値
フェーズ0 BAC	¥0.25M
$EAC (P0) = AC + (BAC - EV) \div CPI$	¥0.16M
$ETC (P0) = EAC - AC$	¥0.08M
$VAC (P0) = BAC - EAC$	+¥0.09M 予算内
TCPI	0.87 — フェーズ0を予算内完了するために必要な効率

6. フェーズ別予測（基準値予測）

6.1 フェーズ0 — 準備期

項目	値
期間	M1～M3（2026年4～6月）
BAC	¥0.25M
計画完了日	2026年6月30日
ゲート基準	創設チームの口頭合意；村リーダーへの情報共有
現状予測	2026年6月 オンスケジュール
コスト予測	¥0.16～0.22M

6.2 フェーズ1 — 基盤構築期

項目	値
期間	M4～M9（2026年7～12月）
BAC	¥5.5M
計画完了日	2026年12月31日
ゲート基準	¥300万～800万円確保；法人登記完了；各調査完了
クリティカルパス	林業・エネルギー調査（2026年Q3発注）
主要リスク	政府補助金承認は計画より2～3か月かかる場合が多い
対応策	調査範囲を若干縮小；P2開始を1～2か月延期

6.3 フェーズ2 — 試験設計期

項目	値
期間	M10～M18（2027年1～9月）
BAC	¥22.25M
計画完了日	2027年9月30日
ゲート基準	¥3,000万～5,000万円確保；詳細設計完了；主要許認可取得
クリティカルパス	METI許認可・FIT登録（6か月以上かかる場合あり）
主要リスク	許認可遅延によりP3開始が2027年10月以降にずれ込む

6.4 フェーズ3 — 試験建設期


項目	値
期間	M19～M30（2027年10月～2028年9月）
BAC	¥132M
計画完了日	2028年9月30日
クリティカルパス	校舎改修 → 太陽光・蓄電池設置 → EV充電 → 調整・稼働

項目	値
主要リスク	建物構造上の問題によるスコープ増大（現状：低確率、高影響）
対応策	WBS 5.9予備費¥16M + マネジメント予備費¥17M でバックアップ

7. 三シナリオ予測

シナリオ	説明	EAC	完了日
楽観的	全補助金一発採択；建物良好；許認可遅延なし	¥152M	2028年8月
基本ケース	許認可1件遅延（+2か月）；補助金1件翌年繰越；CPI≈1.0	¥168M	2028年9月
悲観的	許認可2件遅延；建物補修必要；補助金不足 — MR取崩し	¥195M	2029年3月

図4 — 三シナリオ EAC 比較

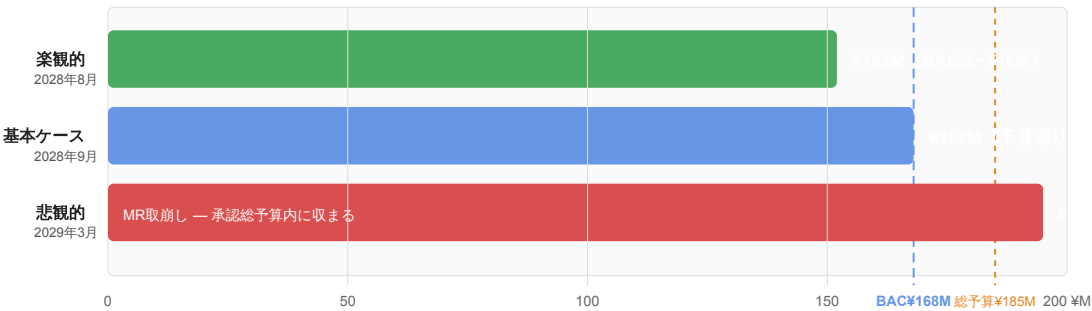

悲観的シナリオは失敗ではありません — プロジェクトが¥195M（承認総予算¥185M + 追加¥10M MR以内）で6か月の遅延を伴って実行されるケースです。

8. パフォーマンス閾値とエスカレーション

閾値	SPI または CPI	対応
グリーン	0.95 ～ 1.10	通常報告；対応不要
イエロー	0.85 ～ 0.94	代表理事に通知；2週間以内に回復計画を作成
オレンジ	0.75 ～ 0.84	理事会への報告義務；選択肢付き回復計画を提示
レッド	0.75未満	正式な理事会審査；フェーズの再スコープまたはMR取崩しを検討

9. EVM報告サイクル

頻度	報告書	宛先	内容
月次	EVM状況報告	理事会・主要資金提供者	PV/EV/AC表；SPI/CPI；SV/CV；EAC更新；課題
ゲート毎	ゲート審査パッケージ	理事会 + 主要資金提供者	完全EVM審査；シナリオ予測；進行・中止判断
四半期	ステークホルダー要約	村役場・アドバイザー	コスト・スケジュール状況；マイルストーン進捗
年次	年度末審査	全ステークホルダー	完全財務報告；EVM監査；翌年基準値

10. 前提条件と制約

前提条件

- プロジェクト開始日：2026年4月1日（第1か月）
- 全フェーズ期間は祝日を含む暦月
- 各調査は単一ベンダーに発注（分割発注なし）
- フェーズ3建設費は2026年奈良県農村部建設指数に基づく
- 為替レート前提（蘭系・国際コーポレートパートナー向け）：¥150/EUR

制約条件

- BAC ¥168Mは**上限**；ゲート3での確定資金なしにP3は着手不可
- マネジメント予備費の取崩しには理事会承認が必要
- データはJPY（円）で報告；外貨取引は取引日レートで換算
- フェーズ1フィージビリティスタディは**全体精度の最大の決定要因** — M9以前の全EACは不確実性が高い（±40%）

11. 制限事項と正直な注意書き

1. **第2か月時点のCPI・SPIは統計的に信頼性がありません。** ¥0.08Mの実績コストデータのみでは、指数はプロジェクト全体ではなくフェーズ0の特性を反映しています。フェーズ1コスト¥200～300Mが確定した後に初めて信頼性が高まります。
2. **フェーズ3の予算レンジは広い。** ¥8,000万～2億円というレンジは、建物状態・機器調達・系統接続コストの不確実性を正直に反映しています。EVM基準値はWBS 5.0に¥132Mを使用し、¥16Mのフェーズ3予備費と¥17Mのマネジメント予備費がこのレンジを吸収します。
3. **資金調達ゲートが主要管理メカニズムです。** EVMはフェーズ内の効率を監視し、ゲートは次フェーズを開始するかどうかを制御します。
4. **フェーズ1フィージビリティスタディが基準値を大幅に改定します。** M9後に正式な基準値改訂を行います。

12. 基準値改訂方針

PMBは以下の場合に正式に改訂可能：

- フェーズ1フィージビリティスタディ完了後（M9での必須改訂）
- 確定資金が計画値と±20%以上乖離した場合
- 理事会承認のスコープ変更を反映する場合
- マネジメント予備費の取崩し時

各改訂は記録：旧基準値、新基準値、理由、承認者、日付。
改訂番号（基準値Rev.0＝本書；Rev.1＝フェーズ1後改訂）。

Rob Oudendijk — YR-Design / Safecast

奈良県御杖村

2026年5月
