

mitsue_phases_funding_flowchart_jp

バージョン: v2.2 (Baseline Rev 1) | 最終更新: 2026-06-07

三津江プロジェクト — フェーズ・資金調達フローチャート

図1 — フェーズ構造と資金調達ゲート






図2 ― 各ゲートへの資金調達ソース

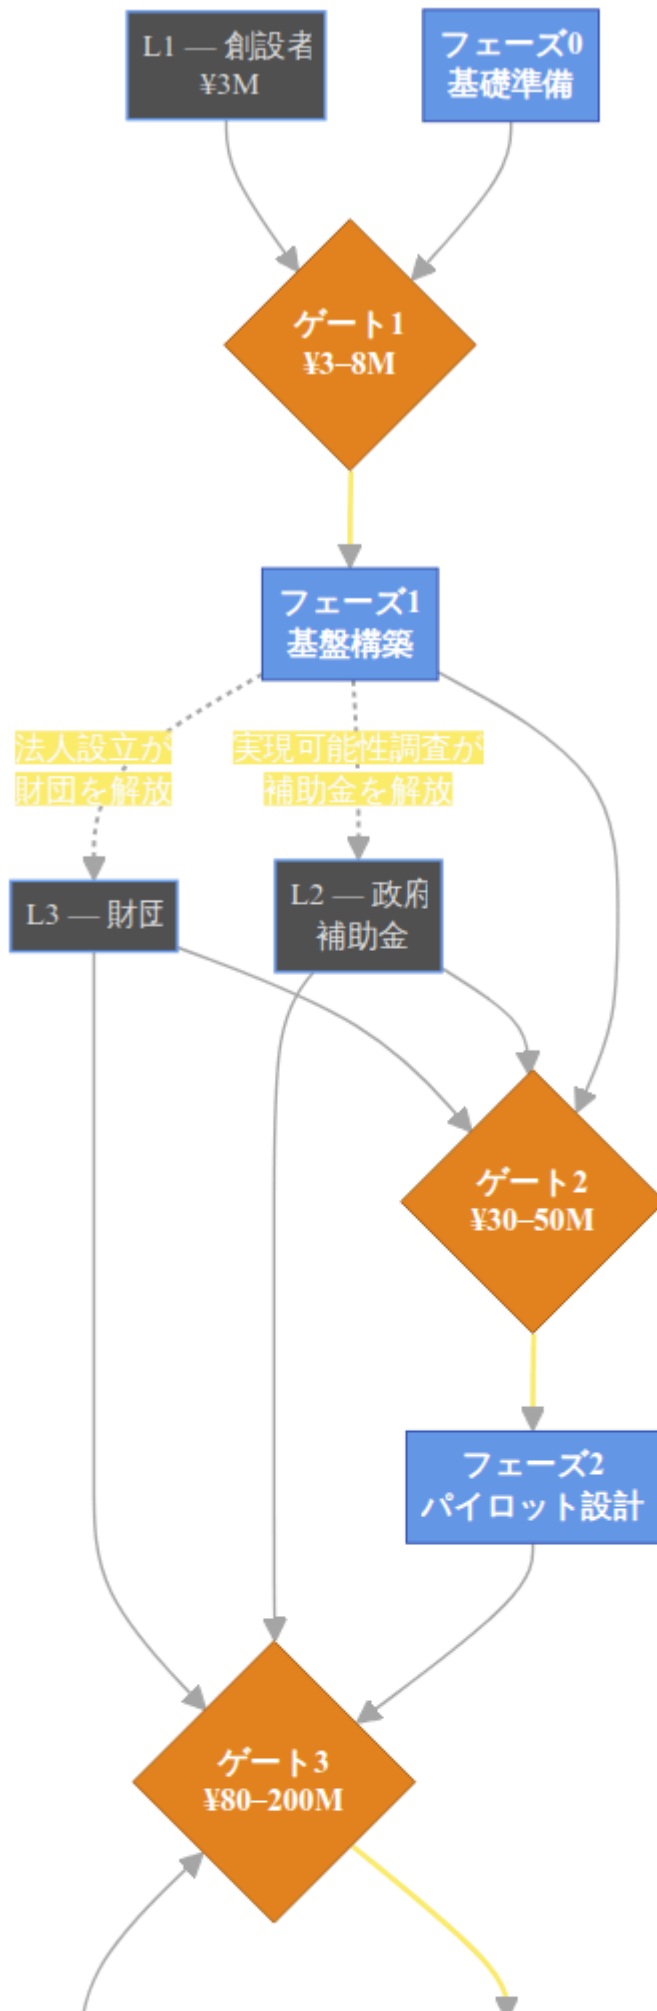

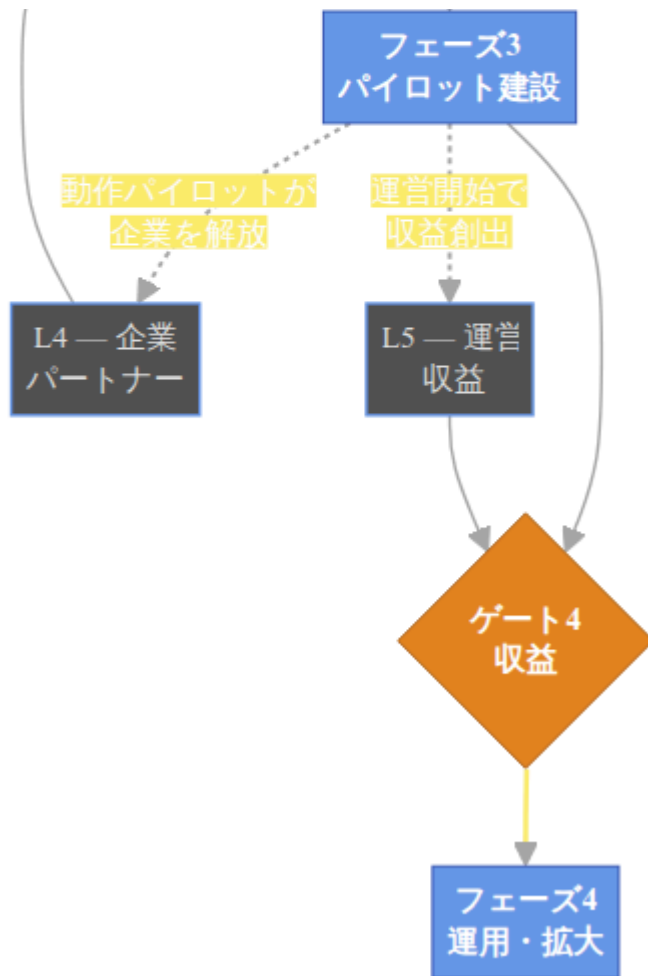

凡例

形状・色	意味
水色ボックス (#6796e6)	プロジェクトフェーズ — 実施内容
オレンジ色ひし形 (#e58520)	資金調達ゲート — フェーズ間のチェックポイント
スレートボックス・水色ボーダー (#505050 / #6796e6)	資金調達ソース・レイヤー
暗いダッシュボックス・黄色ボーダー	ゲート不通過時の保留・縮小アクション
実線矢印	順次フロー / 資金流入
点線矢印	フィードバックループ — フェーズ成果物が次の資金レイヤーを解放

読み方

1. 上段を左から右へ読む — これがプロジェクトの5フェーズを通じた前進パスです。
2. 黄色ひし形は判断ゲートです。各ゲートは「次のフェーズを開始するのに十分な資金を確保できたか？」を問います。通過 → 前進。資金不足 → 灰色の保留・縮小ボックスに入り、再提案します。
3. 下段は資金調達スタックです。矢印は各資金ソースが解放するゲートに向かって上方向に伸びます。
4. 点線矢印がループを閉じます。フェーズを完了すると成果物（実現可能性調査、法人設立、動作パイロット）が生まれ、それ自体が次の資金レイヤーを解放します。これがプロジェクトのエンジンです。

資金調達スタック — 現状 (Baseline Rev 1、2026年5月)

資金レイヤー	調達元	金額 (¥M)
L1 — 設立者	設立者出資 (Rob Oudendijk)	¥6M
L2 — 政府補助金	国・県・市町村補助金	¥115M
L3 — 財団	慈善財団	¥33M
L4 — 企業パートナー	企業サステナビリティ・CSR	¥35M
L5 — 事業収益	データセンター・バイオマス/太陽光エネルギー・EV充電の初期収益	¥3M
調達済み・確約合計		¥192M
BAC (PMB)	プロジェクト予算ベースライン	¥220M
マネジメント予備費	理事会管理予備費	¥25M
総プロジェクト予算		¥245M
BAC対資金不足額	BAC充足に必要な追加調達額	¥28M
総予算対資金不足額	予備費含む充足に必要な追加調達額	¥53M

注記：¥28M～¥53Mの資金不足は、フェーズ2 (M10～M18) において追加の政府補助金・新規企業提携・つなぎ融資により補填する計画です。上記の資金調達スタックは、2026年5月時点の確約・見込みを反映したものです。ステークホルダーへの透明性確保のため、不足額は明示しています。数字を人為的に嵩上げすることはいたしません。このギャップを埋める具体的かつ名前のある道筋が、村主導の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（環境省、国の脱炭素資金ラダー第2段）である。補助率：太陽光・蓄電池・EV・自営線設備費の2/3～3/4、官民連携を通じて村へ交付。フェーズ2～3を対象とする。図2のL2（政府補助金）は、この自治体経由のルートを含む。ベースラインRev 2 (M9、2026年12月予定) に確定交付金額を反映する。

出典：環境省 — 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金：
<https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/grants/>・実施要領（補助率2/3・3/4の条件）：<https://www.env.go.jp/content/900470616.pdf>
