

三津江プロジェクトーフェーズ・資金調達フローチャート

図1ーフェーズ構造と資金調達ゲート






図2 — 各ゲートへの資金調達ソース

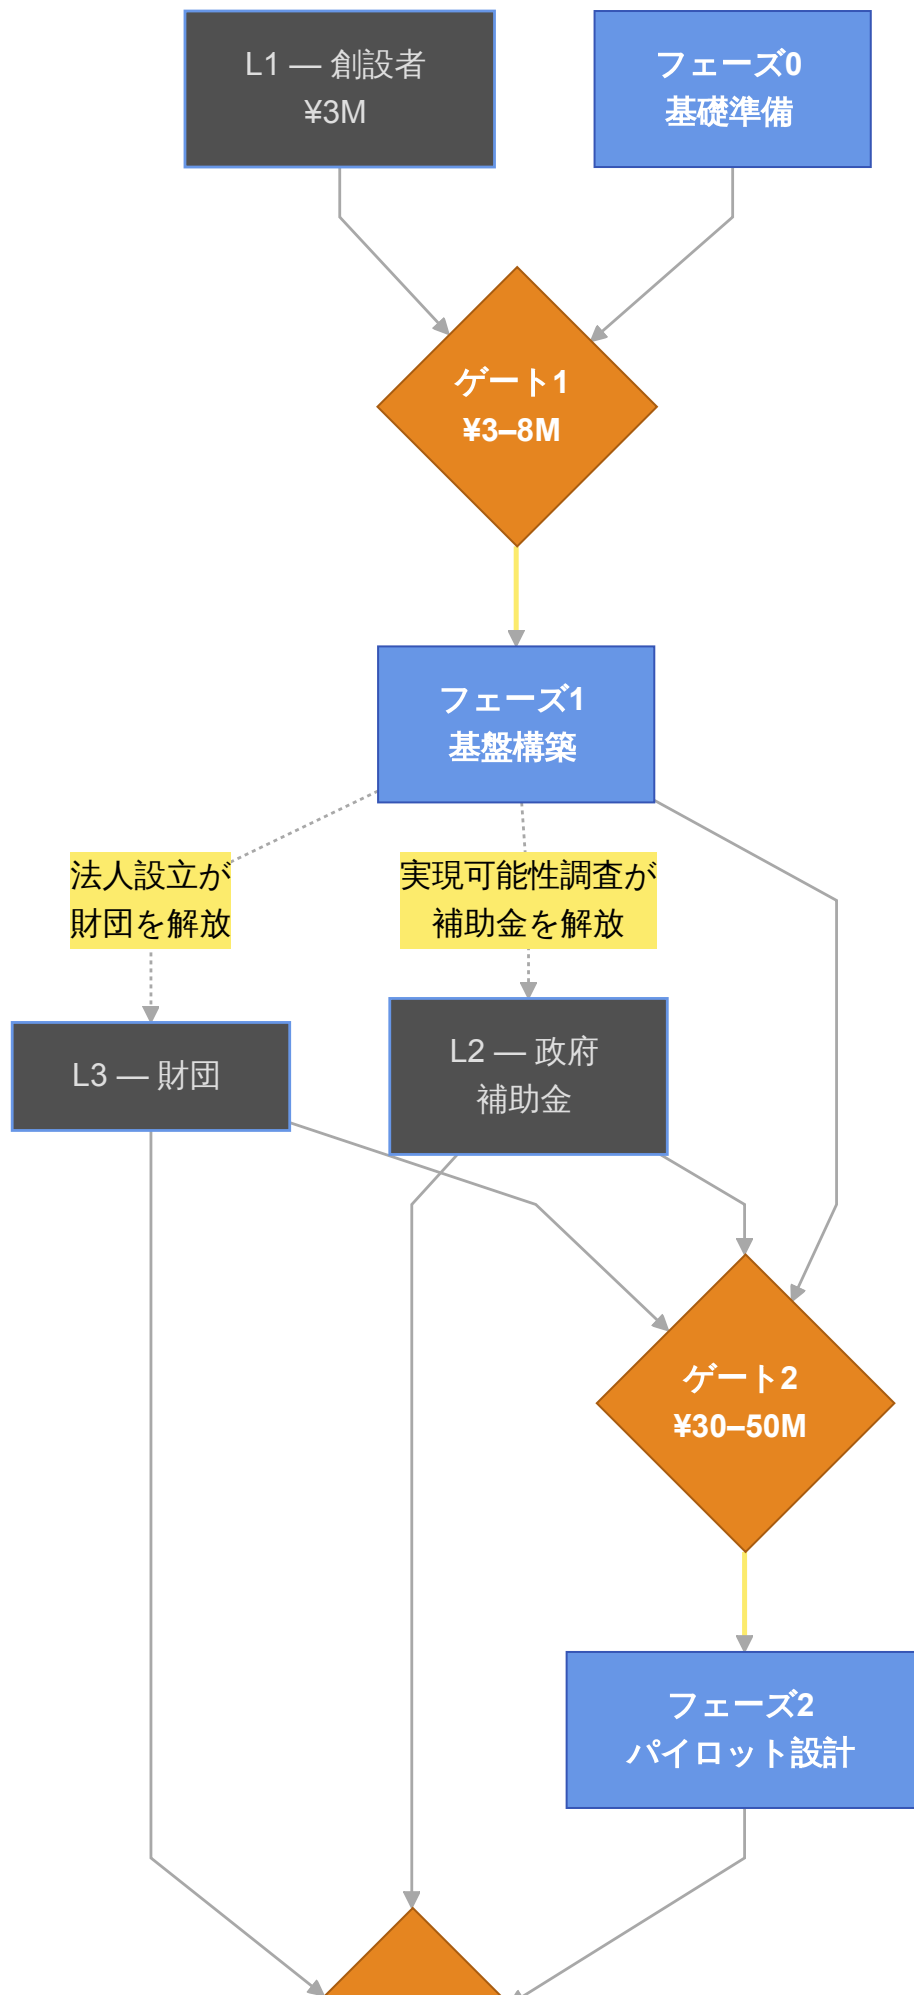

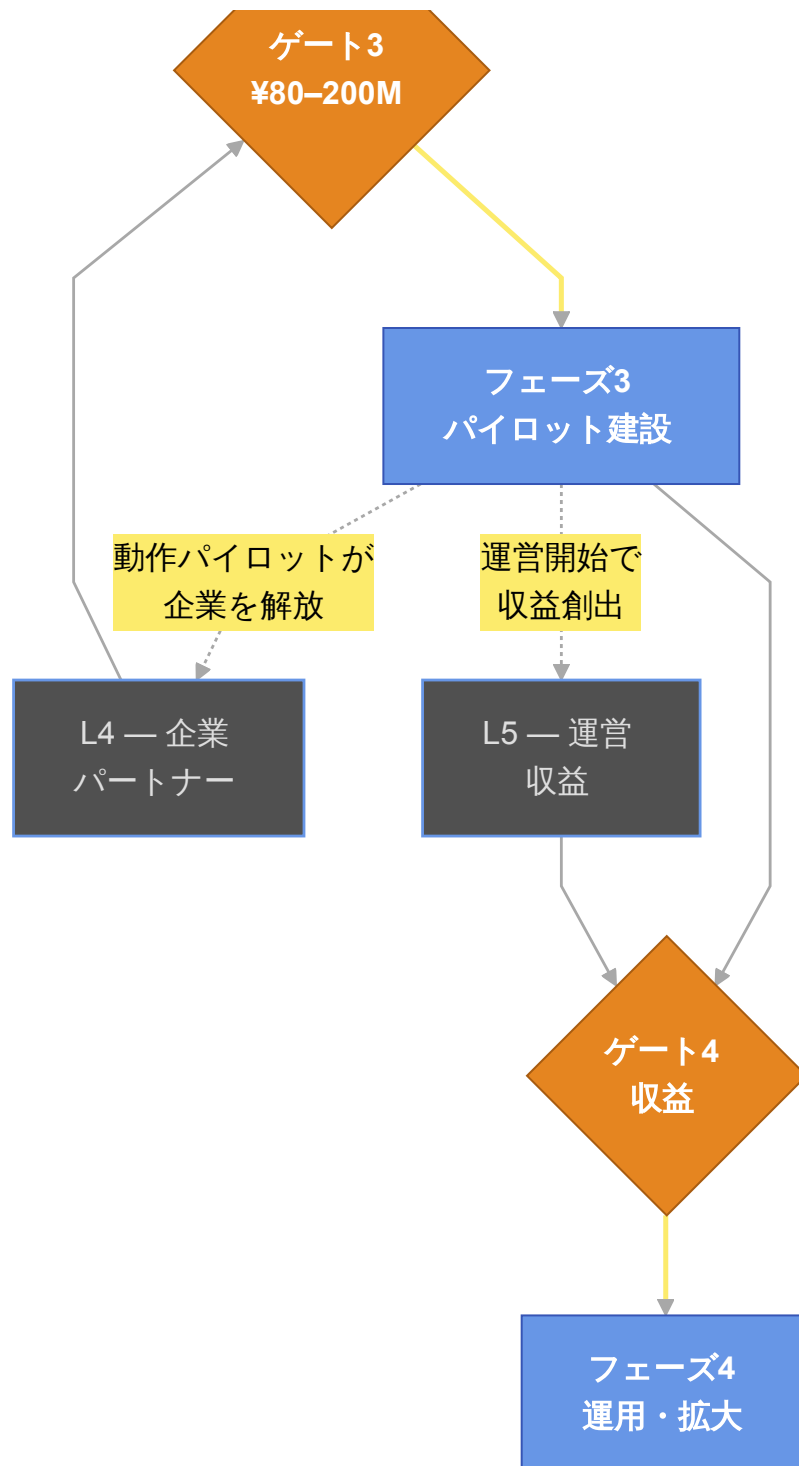

凡例

形状・色	意味
水色ボックス (#6796e6)	プロジェクトフェーズ — 実施内容
オレンジ色ひし形 (#e58520)	資金調達ゲート — フェーズ間のチェックポイント
スレートボックス・水色ボーダー (#505050 / #6796e6)	資金調達ソース・レイヤー
暗いダッシュボックス・黄色ボーダー	ゲート不通過時の保留・縮小アクション
実線矢印	順次フロー / 資金流入

形状・色	意味
点線矢印	フィードバックループーフェーズ成果物が次の資金レイヤーを解放

読み方

- 1. 上段を左から右へ読むーこれがプロジェクトの5フェーズを通じた前進パスです。
- 2. 黄色ひし形は判断ゲートです。各ゲートは「次のフェーズを開始するのに十分な資金を確保できたか？」を問います。通過 → 前進。資金不足 → 灰色の保留・縮小ボックスに入り、再提案します。
- 3. 下段は資金調達スタックです。矢印は各資金ソースが解放するゲートに向かって上方向に伸びます。
- 4. 点線矢印がループを閉じます。フェーズを完了すると成果物（実現可能性調査、法人設立、動作パイロット）が生まれ、それ自体が次の資金レイヤーを解放します。これがプロジェクトのエンジンです。

資金調達スタックー現状（Baseline Rev 1、2026年5月）

資金レイヤー	調達元	金額（¥M）
L1ー設立者	設立者出資（Rob Oudendijk）	¥6M
L2ー政府補助金	国・県・市町村補助金	¥115M
L3ー財団	慈善財団	¥33M
L4ー企業パートナー	企業サステナビリティ・CSR	¥35M
L5ー事業収益	データセンター・EV充電初期収益	¥3M
調達済み・確約合計		¥192M
BAC（PMB）	プロジェクト予算ベースライン	¥220M
マネジメント予備費	理事会管理予備費	¥25M
総プロジェクト予算		¥245M
BAC対資金不足額	BAC充足に必要な追加調達額	¥28M
総予算対資金不足額	予備費含む充足に必要な追加調達額	¥53M

注記：¥28M～¥53Mの資金不足は、フェーズ2（M10～M18）において追加の政府補助金・新規企業提携・つなぎ融資により補填する計画です。上記の資金調達スタックは、2026年5月時点の確約・見込みを反映したものです。ステークホルダーへの透明性確保のため、不足額は明示しています。数字を人為的に嵩上げすることはいたしません。
