

PROJECT DOCUMENT

BIOMASS ENERGY & AI

御杖村における地域植林

三津江プロジェクトー フェーズ・資金調達フローチャート

御

Version	v2.6
Date	2026-07-11
Author	Rob Oudendijk

三津江プロジェクト — フェーズ・資金調達フローチャート

スケジュール注記 (2026-07-03)： フェーズの日付は、現行の正式スケジュールである稼働中のOpenProjectガントチャートを反映しています。当初の2026年4月起点の月次計画（P0 1～3か月目 ... P3 19～30か月目）より遅れています。コスト基準の再同期はEVMベースラインRev 2（2026年12月予定）の作業です。

図1 — フェーズ構造と資金調達ゲート






図2 — 各ゲートへの資金調達ソース

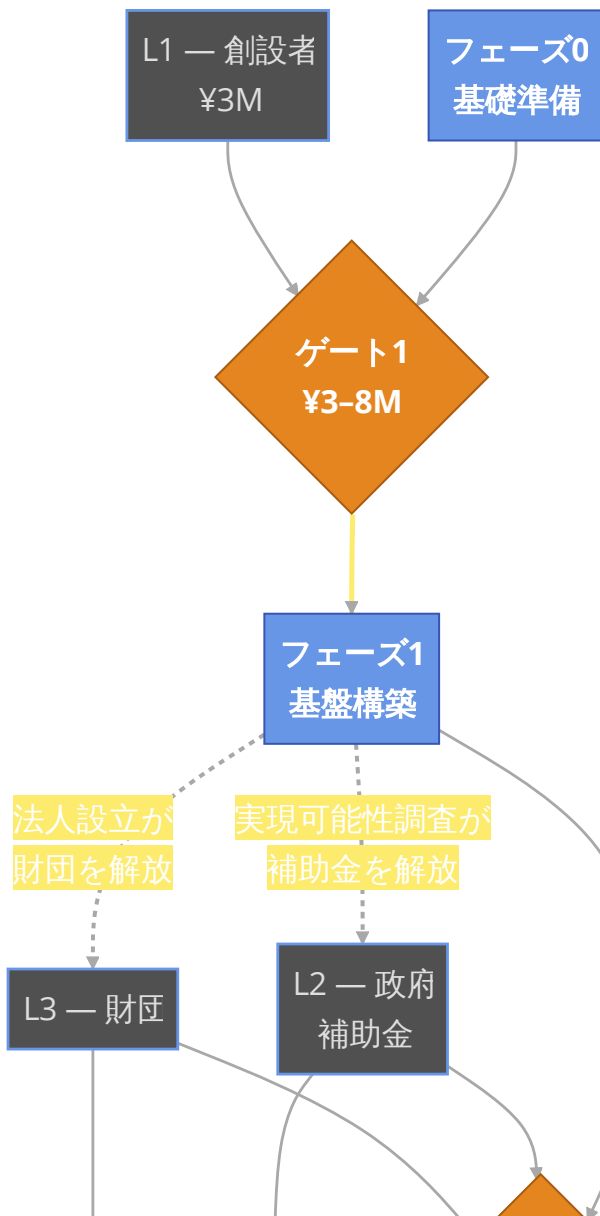

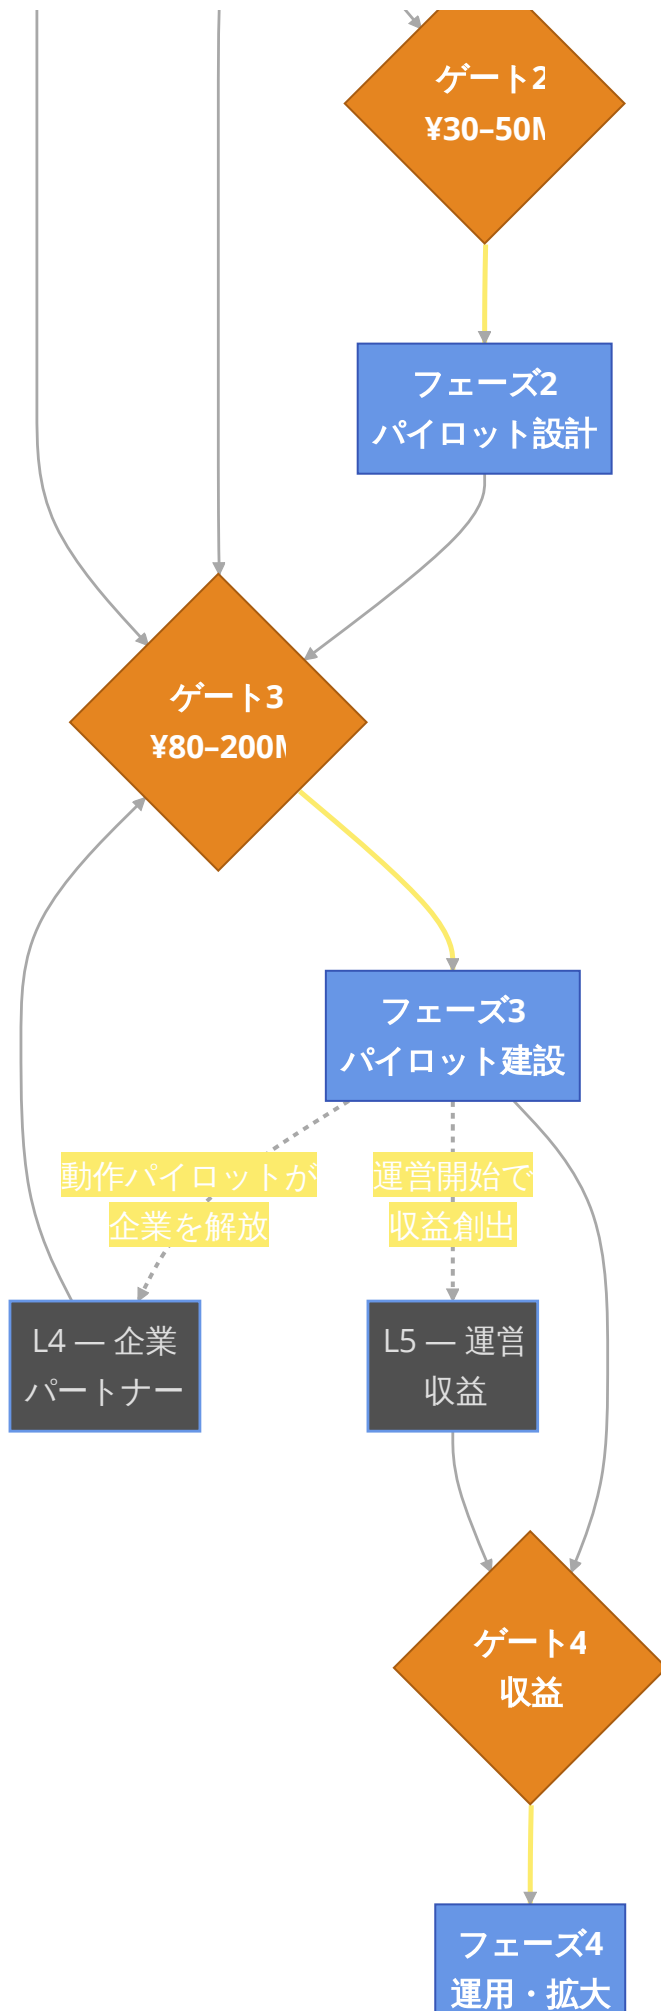

凡例

形状・色	意味
水色ボックス (#6796e6)	プロジェクトフェーズ — 実施内容
オレンジ色ひし形 (#e58520)	資金調達ゲート — フェーズ間のチェックポイント
スレートボックス・水色ボーダー (#505050 / #6796e6)	資金調達ソース・レイヤー
暗いダッシュボックス・黄色ボーダー	ゲート不通過時の保留・縮小アクション
実線矢印	順次フロー / 資金流入
点線矢印	フィードバックループ — フェーズ成果物が次の資金レイヤーを解放

読み方

- 上段を左から右へ読む — これがプロジェクトの5フェーズを通じた前進パスです。
- 黄色ひし形は判断ゲートです。各ゲートは「次のフェーズを開始するのに十分な資金を確保できたか？」を問います。通過 → 前進。資金不足 → 灰色の保留・縮小ボックスに入り、再提案します。
- 下段は資金調達スタックです。矢印は各資金ソースが解放するゲートに向かって上方向に伸びます。
- 点線矢印がループを閉じます。フェーズを完了すると成果物（実現可能性調査、法人設立、動作パイロット）が生まれ、それ自体が次の資金レイヤーを解放します。これがプロジェクトのエンジンです。

資金調達スタック — 目標・パイプライン (Baseline Rev 1、2026年5月) — 現時点で確保済みの資金はゼロ

資金レイヤー	調達元	目標金額 (¥M)	現時点の確保額
L1 — 設立者	設立者出資 (Rob Oudendijk)	¥6M	¥0 (未確約)
L2 — 政府補助金	国・県・市町村補助金	¥115M	¥0 (未申請・未採択)
L3 — 財団	慈善財団	¥33M	¥0 (未申請・未採択)
L4 — 企業パートナー	企業サステナビリティ・CSR	¥35M	¥0 (未申請・未採択)
L5 — 事業収益	データセンター・バイオマス/太陽光エネルギー・EV充電の初期収益	¥3M	¥0 (収益発生前)
資金調達目標合計 (未確保)		¥192M	¥0
BAC (PMB)	プロジェクト予算ベースライン	¥220M	
マネジメント予備費	理事会管理予備費	¥25M	
総プロジェクト予算		¥245M	

資金レイヤー	調達元	目標金額 (¥M)	現時点の確保額
BAC対資金不足額	目標スタックが全額実現した場合にBAC充足に必要な追加調達額	¥28M	
総予算対資金不足額	目標スタックが全額実現した場合に予備費含む充足に必要な追加調達額	¥53M	

注記 — 現時点で確保済みの資金はありません。上表は資金調達の目標・パイプラインであり、確保済み・受領済みの資金ではありません。2026年5月時点で、L1の設立者出資を含む5層すべてで実際に確保された金額は¥0です。すべての数字は今後追求し、合意成立とともに確定額へ置き換えていく計画上の前提です。¥28M～¥53Mの不足額は¥192Mの目標スタックが全額実現することを前提とした数字であり、実現しない場合の実際の不足はより大きくなります。このギャップを埋める具体的かつ名前のある道筋が、村主導の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金（環境省、国の脱炭素資金ラダー第2段）である。補助率：太陽光・蓄電池・EV・自営線設備費の2/3～3/4、官民連携を通じて村へ交付。フェーズ2～3を対象とする。図2のL2（政府補助金）は、この自治体経由のルートを含む。ベースラインRev 2（M9、2026年12月予定）に確定交付金額を反映する。

タイミング・ルール（キャッシュフローモデル）。このギャップは単なる予算上の不足ではなく、特定の月に現れる資金の壁である。¥192Mの目標スタックが計画どおり全額実現した最良ケース（現時点でその一部も確保されていない）でも、月次資金残高はM28（2028年7月）にマイナスとなり、底値は-¥28M（ギャップとちょうど一致）に達する。したがって資金は事業終了時ではなくゲート3（M21）までに確保・支出可能とする必要があり、フェーズ3のバーンピークに対するショックアブソーバーとして約¥25Mのブリッジ枠を用意すること。[mitsue_cashflow_model_jp.md](#) §5およびEVM計画 §8.1/§10参照。

出典：環境省 — 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金: <https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/grants/>・実施要領（補助率2/3・3/4の条件）: <https://www.env.go.jp/content/900470616.pdf>

[mitsue_implementation_plan_jp.md](#) より引用 — 2026年5月
