All open

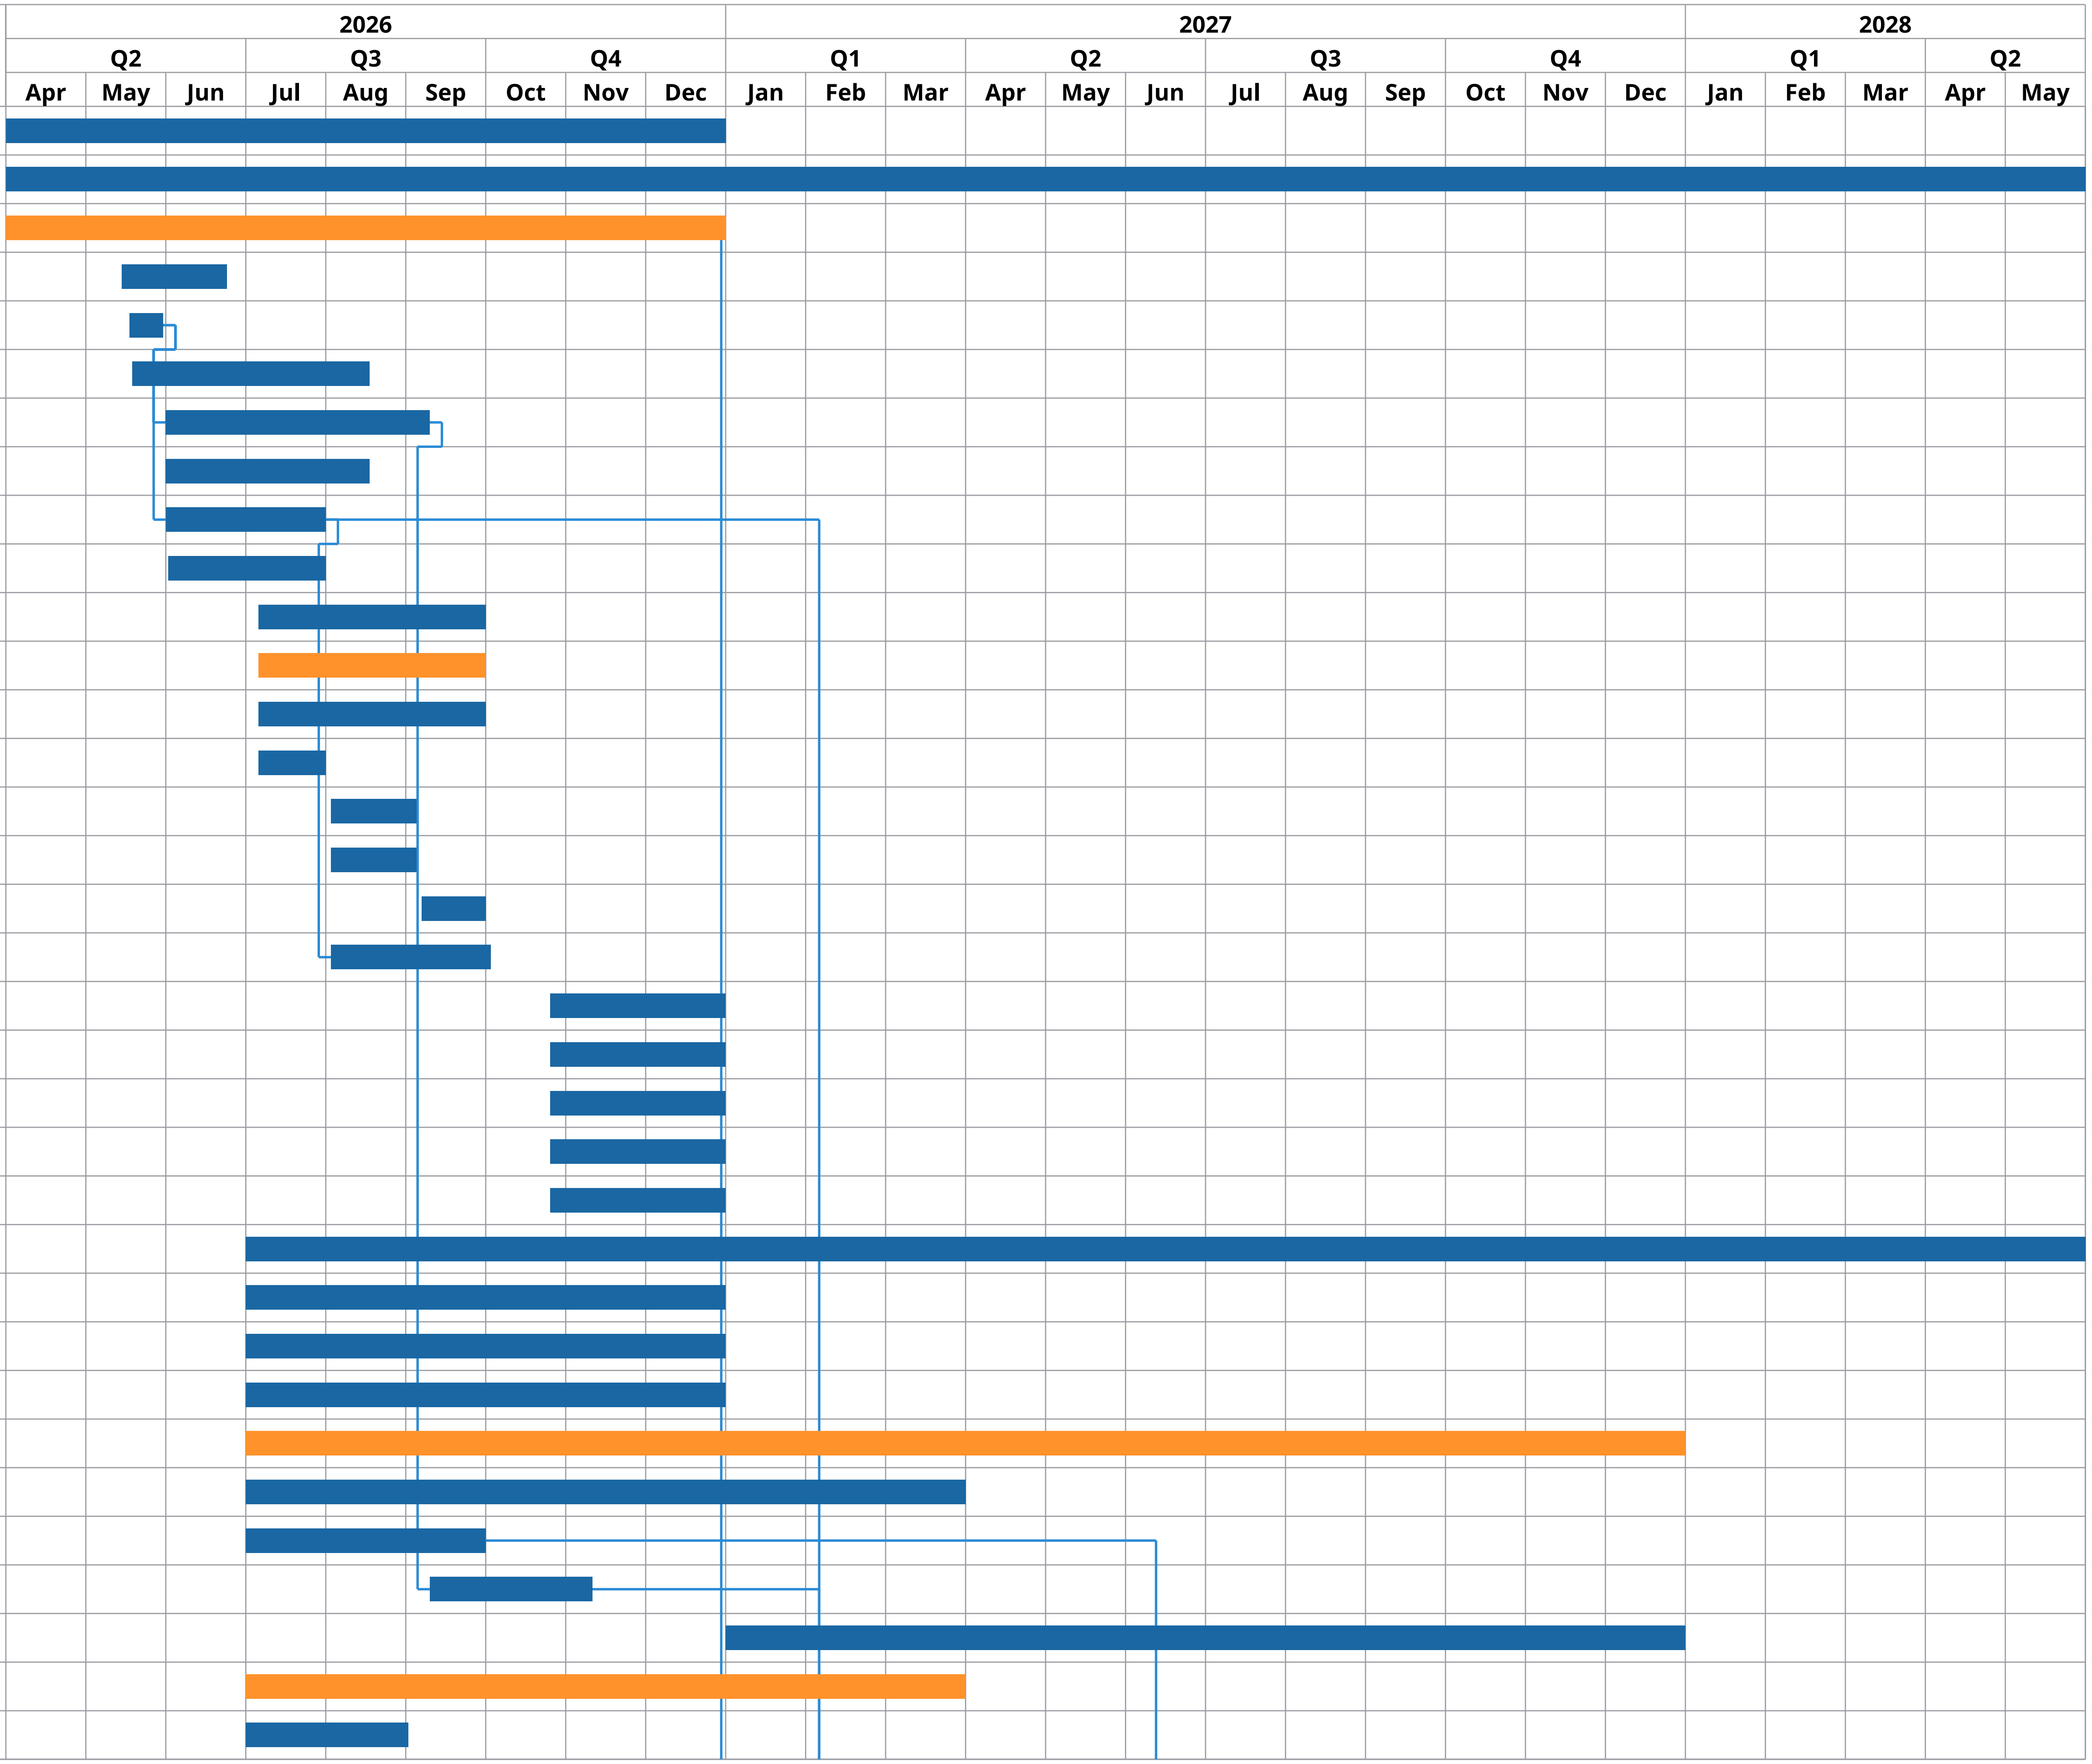

Task #142 • In progress • 04/01/2026 - 12/31/2026
【リスク】創設者のロブへの依存

Task #141 • In progress • 04/01/2026 - 12/31/2030
【リスク】フェーズ間の資金不足

Summary task #130 • New • 04/01/2026 - 12/31/2026
フェーズ0：基盤整備

Task #155 • In progress • 05/15/2026 - 06/23/2026
プロジェクト用Slack／Signalリストの開設

Task #147 • In progress • 05/18/2026 - 05/30/2026
御杖村長との非公式面談

Task #148 • In progress • 05/19/2026 - 08/17/2026
菅野および周辺集落の自治会リーダーとの面談

Task #154 • In progress • 06/01/2026 - 09/09/2026
奈良県内の行政書士候補1～2名への初回相談

Task #151 • In progress • 06/01/2026 - 08/17/2026
賛同する地主2～3名との非公式協議

Task #149 • In progress • 06/01/2026 - 07/31/2026
日本人共同創設者の特定・確保

Task #234 • New • 06/02/2026 - 07/31/2026
Quantum Mesh — テクノロジーパートナー・投資家として調査する

Task #267 • New • 07/06/2026 - 09/30/2026
御杖温泉（姫石の湯）が指定避難所かを確認

Summary task #261 • New • 07/06/2026 - 09/30/2026
菅野オーガニック バイオマスCHPパイロット（フェーズ0準備）

Task #277 • New • 07/06/2026 - 09/30/2026
菅野CHP — 燃料チッパー調達（実証機＋商用規模）

Task #262 • New • 07/06/2026 - 07/31/2026
菅野CHP — 現地視察・森林間伐評価

Task #264 • New • 08/03/2026 - 09/04/2026
菅野CHP — 補助金適格性調査（経産省/農水省/林野庁/Jクレジット）

Task #263 • New • 08/03/2026 - 09/04/2026
菅野CHP — ガス化装置サプライヤー選定・見積取得（国内2～3社）

Task #265 • New • 09/07/2026 - 09/30/2026
菅野CHP — 系統接続フィージビリティ確認（地域電力会社）

Task #150 • In progress • 08/03/2026 - 10/02/2026
創設チームメンバー3～5名の選定

Task #291 • New • 10/26/2026 - 12/31/2026
【フェーズ0ゲート】ベースラインRev 2の承認（2026年12月）

Task #290 • New • 10/26/2026 - 12/31/2026
【フェーズ0ゲート】系統接続の回答取得（掛変電所の容量）

Task #289 • New • 10/26/2026 - 12/31/2026
【フェーズ0ゲート】資金計画の確定・GX地域共創の申請（第2回締切2026-11-30）

Task #288 • New • 10/26/2026 - 12/31/2026
【フェーズ0ゲート】法人形態の方向性を決定

Task #287 • New • 10/26/2026 - 12/31/2026
【フェーズ0ゲート】試作サイトと燃料パートナーの原則合意（組合CHP。AI DCの立地はゲート外）

Task #146 • In progress • 07/01/2026 - 12/31/2030
【リスク】チーム内対立・使命のぶれ

Task #144 • In progress • 07/01/2026 - 12/31/2026
【リスク】光ファイバー接続の不足

Task #143 • In progress • 07/01/2026 - 12/31/2026
【リスク】建物のデータセンター転用不適合

Task #140 • In progress • 07/01/2026 - 12/31/2026
【リスク】林業採算性の悪化

Summary task #138 • New • 07/01/2026 - 12/31/2027
【法務】専門家サポート

Task #218 • New • 07/01/2026 - 03/31/2027
弁護士への相談（地主との契約書作成）

Task #217 • In progress • 07/01/2026 - 09/30/2026
公認会計士・税理士の起用

Task #216 • New • 09/10/2026 - 11/10/2026
行政書士の起用（奈良県内推奨）

Task #219 • New • 01/01/2027 - 12/31/2027
弁理士への相談（新規IP発生時のみ）

Summary task #136 • New • 07/01/2026 - 03/31/2027
【法務】法人・税務

Task #203 • In progress • 07/01/2026 - 09/01/2026
一般社団法人の設立登記

All open

Task #206 • New • 09/01/2026 - 11/02/2026
会計システムの導入（弥生会計等）

Task #205 • New • 09/01/2026 - 09/30/2026
法人口座の開設

Task #204 • New • 09/01/2026 - 09/30/2026
税務登録（法人税・消費税）

Task #207 • New • 03/01/2027 - 03/31/2027
年次財務報告

Summary task #135 • New • 07/01/2026 - 04/04/2031
横断的タスク

Task #200 • New • 07/01/2026 - 12/31/2026
後継計画の文書化（ロブへの依存度低減）

Task #199 • New • 07/06/2026 - 04/04/2031
資金源の多様化（単一依存の回避）

Task #201 • New • 10/01/2026 - 12/31/2030
四半期ごとの理事会レビュー

Task #202 • New • 03/01/2027 - 12/31/2030
年次財務報告

Summary task #133 • New • 07/06/2026 - 03/21/2030
フェーズ3：建設・初期運営

Task #269 • New • 07/06/2026 - 09/30/2026
天川村との知見交換：高付加価値広葉樹の収益化＋担い手研修

Task #191 • New • 09/19/2028 - 06/19/2029
廃校一棟の事務所・小規模サーバー室への改修

Task #188 • New • 09/19/2028 - 03/20/2029
スギ5〜10haの初回伐採

Task #190 • New • 03/21/2029 - 10/18/2029
バイオマスCHPユニット（主要）の設置・EV充電設備・個人所有太陽光の系統接続

Task #189 • New • 03/21/2029 - 12/19/2029
伐採地への在来種植栽

Task #193 • New • 06/20/2029 - 10/17/2029
EV充電スタンド2〜4基の設置

Task #192 • New • 06/20/2029 - 10/17/2029
サーバー10〜20台の設置（エッジコンピューティング）

Task #194 • New • 12/20/2029 - 03/21/2030
J-クレジット認証の申請

Task #139 • New • 07/08/2026 - 10/06/2026
【リスク】地域住民の反発

Summary task #131 • New • 01/04/2027 - 09/16/2027
フェーズ1：調査・法人設立

Task #166 • New • 01/04/2027 - 06/03/2027
通信環境調査の委託

Task #165 • New • 01/04/2027 - 07/06/2027
建物・敷地調査の委託

Task #164 • New • 01/04/2027 - 07/06/2027
エネルギーシステムフィージビリティスタディの委託

Task #163 • New • 01/04/2027 - 07/06/2027
林業フィージビリティスタディの委託

Task #157 • New • 02/10/2027 - 03/12/2027
定款の草案作成

Task #158 • New • 03/15/2027 - 04/15/2027
定款の公証

Task #159 • New • 04/16/2027 - 05/17/2027
法務局への一般社団法人登記申請

Task #169 • New • 05/18/2027 - 09/16/2027
顧問委員会の正式発足

Task #168 • New • 05/18/2027 - 08/16/2027
日英対応プロジェクトWebサイトの公開（基本版）

Task #167 • New • 05/18/2027 - 08/16/2027
御杖村役場からの関心表明書の取得

Task #161 • New • 05/18/2027 - 06/16/2027
法人口座の開設

Task #160 • New • 05/18/2027 - 06/16/2027
税務登録（法人税・消費税）

Task #162 • New • 06/17/2027 - 08/18/2027
会計システムの導入（弥生会計等）

Task #145 • New • 04/02/2027 - 12/30/2027
【リスク】規制上の遅延
