御杖AIデータセンタープロジェクト

OpenProject

All open

ID	TYPE	SUBJECT	STATUS
142	TASK	【リスク】創設者のロブへの依存	In progress
141	TASK	【リスク】フェーズ間の資金不足	In progress
130	SUMMARY TASK	フェーズ0：基盤整備	New
155	TASK	プロジェクト用Slack／Signalリストの開設	In progress
147	TASK	御杖村長との非公式面談	In progress
148	TASK	菅野および周辺集落の自治会リーダーとの面談	New
154	TASK	奈良県内の行政書士候補1～2名への初回相談	New
151	TASK	賛同する地主2～3名との非公式協議	New
149	TASK	日本人共同創設者の特定・確保	In progress
218	TASK	弁護士への相談（地主との契約書作成）	New
217	TASK	公認会計士・税理士の起用	New
203	TASK	一般社団法人の設立登記	New
200	TASK	後継計画の文書化（ロブへの依存度低減）	New
146	TASK	【リスク】チーム内対立・使命のぶれ	In progress
144	TASK	【リスク】光ファイバー接続の不足	In progress
143	TASK	【リスク】建物のデータセンター転用不適合	In progress
140	TASK	【リスク】林業採算性の悪化	In progress
138	SUMMARY TASK	【法務】専門家サポート	New
136	SUMMARY TASK	【法務】法人・税務	New
135	SUMMARY TASK	横断的タスク	New
199	TASK	資金源の多様化（単一依存の回避）	New
139	TASK	【リスク】地域住民の反発	New
216	TASK	行政書士の起用（奈良県内推奨）	New
150	TASK	創設チームメンバー3～5名の選定	In progress
206	TASK	会計システムの導入（弥生会計等）	New

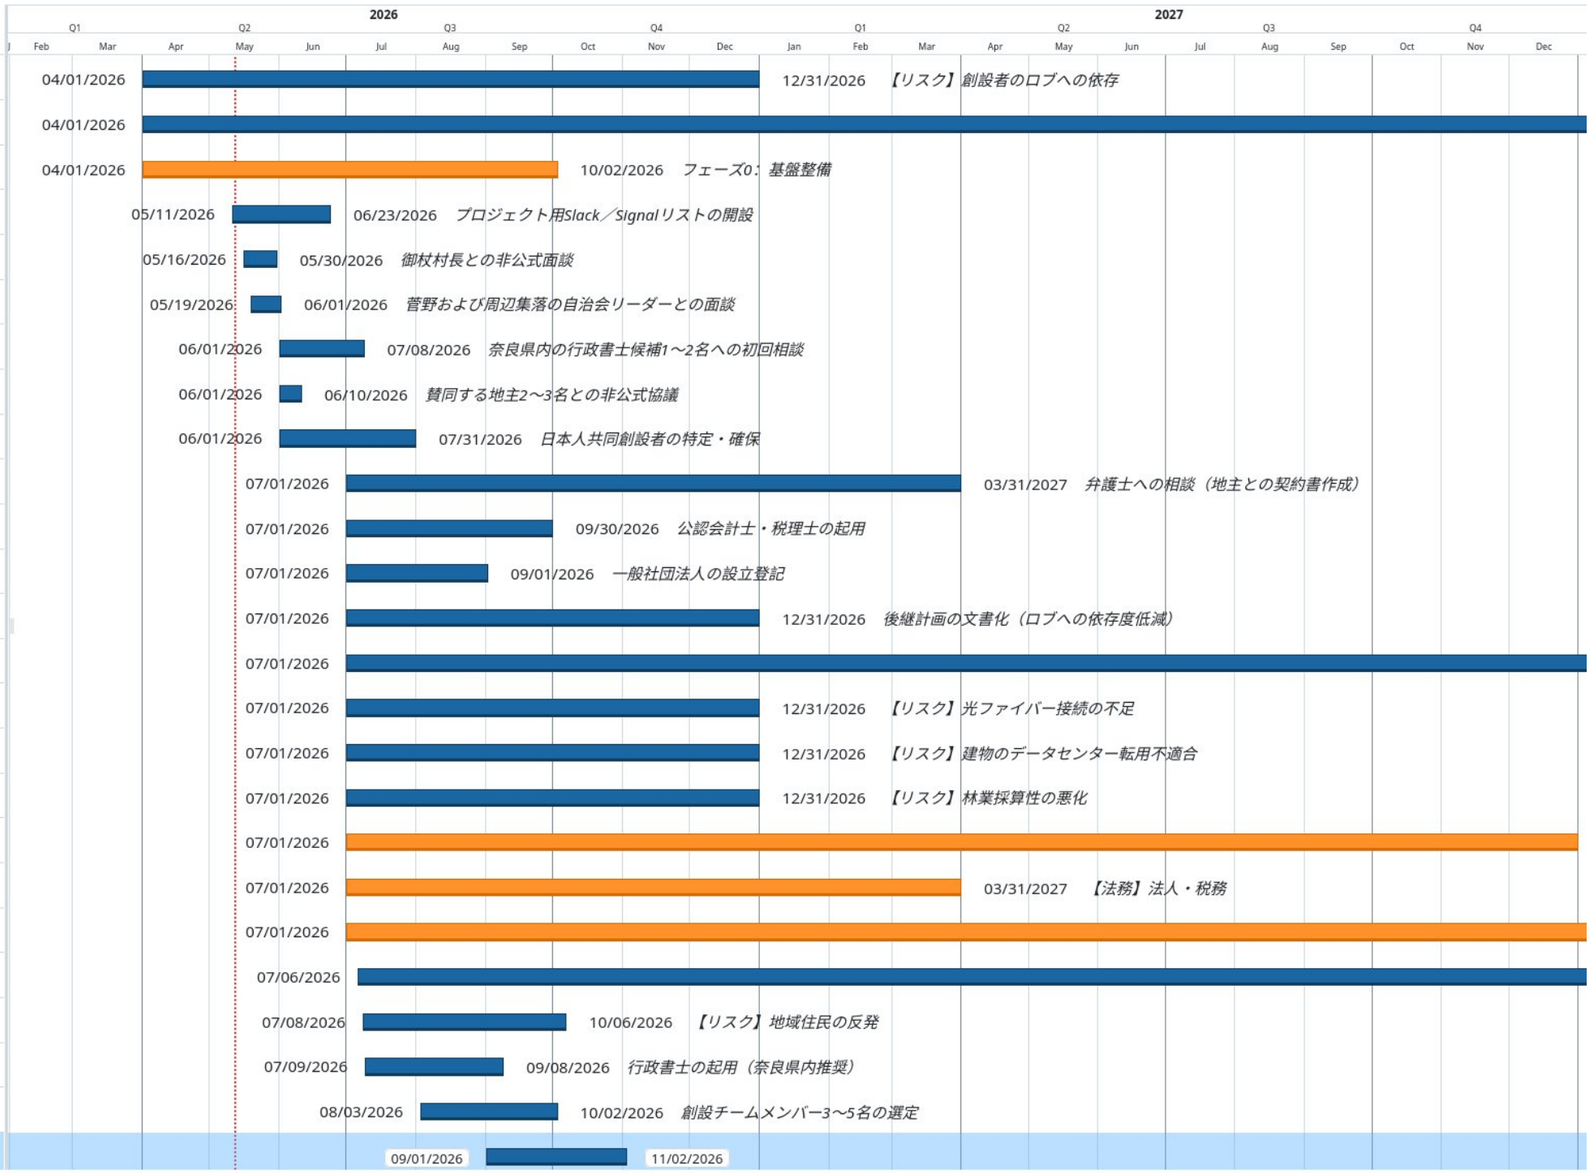

御杖AIデータセンタープロジェクト

OpenProject

All open

ID	TYPE	SUBJECT	STATUS	STAR
163	TASK	林業フィージビリティスタディの委託	New	10/05
157	TASK	定款の草案作成	New	10/05
131	SUMMARY TASK	フェーズ1：調査・法人設立	New	10/05
158	TASK	定款の公証	New	11/05
159	TASK	法務局への一般社団法人登記申請	New	12/09
219	TASK	弁理士への相談（新規IP発生時のみ）	New	01/01
214	TASK	環境アセスメント（規模が基準を超える場合）	New	01/01
210	TASK	建物転用許可（建築基準法）	New	01/01
209	TASK	土地利用調整（農業委員会・農地が関係する場合）	New	01/01
208	TASK	林業許可（伐採届出）	New	01/01
145	TASK	【リスク】規制上の遅延	New	01/01
137	SUMMARY TASK	【法務】各種許認可	New	01/01
169	TASK	顧問委員会の正式発足	New	01/08
168	TASK	日英対応プロジェクトWebサイトの公開（基本版）	New	01/08
167	TASK	御杖村役場からの関心表明書の取得	New	01/08
161	TASK	法人口座の開設	New	01/08
160	TASK	税務登録（法人税・消費税）	New	01/08
212	TASK	電気事業法適合対応	New	02/01
211	TASK	消防認可（バイオマス設備）	New	02/01
162	TASK	会計システムの導入（弥生会計等）	New	02/09
213	TASK	FIT／FIP登録（経済産業省）	New	03/01
207	TASK	年次財務報告	New	03/01
202	TASK	年次財務報告	New	03/01
186	TASK	日本企業への初期打診（NTT・ソフトバンク・住友林業）	New	05/12
185	TASK	オランダ企業への初期打診（Philips・ASML・RHDHV・Arcadis...	New	05/12
176	TASK	地主とのパートナーシップ契約テンプレート作成	New	05/12
170	TASK	詳細設計・建築計画の策定	New	05/12
132	SUMMARY TASK	フェーズ2：許認可・設計・資金調達	New	05/12
